	Dias Contratuais: 180	RDO: 0000022
	Dias Decorridos: 174	Data: 11/10/2025 (Sábado)
Obra: SPA - UFJ	Dias para Terminar: 6	Início: 21/04/2025
Endereço: Rodovia BR-364, Setor Francisco Antônio, 3800, Jataí - GO, 75804-068		Termino Previsto: 18/10/2025

**Relatório Diário de Obra**

Atividades / Tarefas	Quantidade	Unid	Status	Empreiteiro
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	20,5	M³	em execução	CARPLAN Engenharia Projetos

**Ocorrências**

Durante a vistoria técnica realizada em 11 de outubro de 2025, nas obras da Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA/UFJ), Campus Riachuelo, foi constatada a **execução da concretagem das vigas baldrame com concreto produzido in loco**, conforme registro fotográfico e anotação no Diário de Obra (fl. 19 da CARPLAN), essa atividade está em desacordo com as especificações técnicas do contrato.

**Obras sem alvará de construção.**

Descrição do cronograma: item 01 - SERVIÇOS INICIAIS/ DESPESAS GERAIS ; (ATRASADA)

Descrição do cronograma: item 05 - INFRAESTRUTURA ; (ATRASADA)

Descrição do cronograma: item 06 - SUPERESTRUTURA ; (ATRASADA)

**Galeria de Fotos**


Detalhe da execução da concretagem da viga baldrame IN LOCO



Detalhe do concreto sendo rodado IN LOCO com betoneira.



Detalhe da notificação realizada no diário de obra da OBRA, sobre a INCONFORMIDADE.

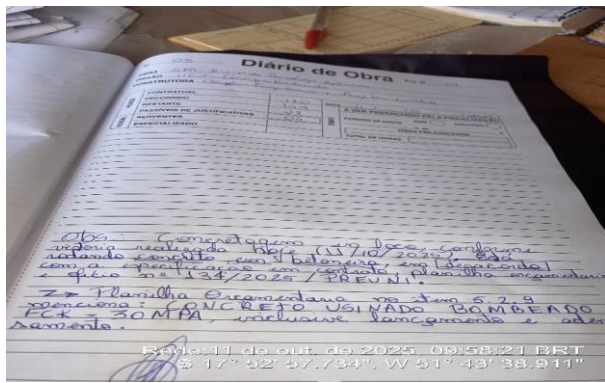

Detalhe do concreto sendo rodado IN LOCO com betoneira



Detalhe da execução da concretagem da viga baldrame IN LOCO



Detalhe do concreto sendo rodado IN LOCO com betoneira

