	Dias Contratuais: 180	RDO: 00000024
	Dias Decorridos: 176	Data: 11/10/2025 (Segunda-feira)
Obra: SPA - UFJ	Dias para Terminar: 4	Início: 21/04/2025
Endereço: Rodovia BR-364, Setor Francisco Antônio, 3800, Jataí - GO, 75804-068		Termino Previsto: 18/10/2025

Relatório Diário de Obra

Atividades / Tarefas	Quantidade	Unidade	Status	Empreiteiro
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	20,5	M³	em execução	CARPLAN Engenharia Projetos

Ocorrências

Ofício nº 130/2025/PREUNI/UFJ (09/10/2025):
 Solicitou à contratada o envio de **novo cronograma físico-financeiro atualizado**, compatível com o estágio atual da obra e com as condições verificadas in loco pela fiscalização, em razão de o cronograma vigente (datado de 26/02/2025) encontrar-se desatualizado.
 Foi estabelecido **prazo de 03 (três) dias úteis** para apresentação da nova versão, contemplando as etapas remanescentes e percentuais ajustados à execução real. Até hoje (13/10/2025) não recebemos.

A fiscalização esteve no local e solicitou a **demolição da viga baldrame** que foi concreto no dia **11/10/2025**.

Ofício nº 135/2025/PREUNI/UFJ (13/10/2025):
 Determinou a **demolição** e o refazimento das vigas baldrame executadas com concreto moldado in loco, constatadas em vistoria técnica e registradas no Diário de Obra nº 023.
 A empresa deverá refazer o serviço utilizando concreto usinado bombeável FCK=30 MPa, conforme o projeto e a planilha contratual (item 5.2.9 – SINAPI 74138/004).
 Foi solicitado o envio, em **até 02 (dois) dias úteis**, do plano detalhado de demolição e reconstrução, contendo a metodologia executiva e ART do engenheiro responsável.




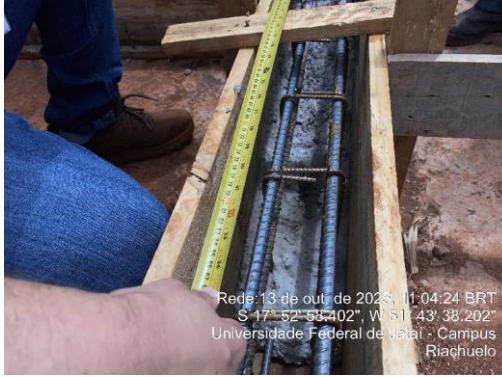
Obras sem alvará de construção.

Descrição do cronograma: item 01 - SERVIÇOS INICIAIS/ DESPESAS GERAIS ; (ATRASADA)

Descrição do cronograma: item 05 - INFRAESTRUTURA ; (ATRASADA)

Descrição do cronograma: item 06 - SUPERESTRUTURA ; (ATRASADA)

Galeria de Fotos


<p>Detalhe da viga baldrame concretada IN LOCO</p>  <p>Rede: 13 de out. de 2025, 10:59:53 BRT S 17° 52' 57.990", W 51° 43' 38.180" Universidade Federal de Jataí - Campus Riachuelo</p>	<p>Detalhe da viga baldrame concretada IN LOCO</p>  <p>Rede: 13 de out. de 2025, 11:10:19 BRT S 17° 52' 58.196", W 51° 43' 38.223" Universidade Federal de Jataí - Campus Riachuelo</p>
<p>Detalhe da viga baldrame concretada IN LOCO</p>  <p>Rede: 13 de out. de 2025, 11:04:02 BRT S 17° 52' 58.402", W 51° 43' 38.202" Universidade Federal de Jataí - Campus Riachuelo</p>	<p>Detalhe da viga baldrame concretada IN LOCO</p>  <p>Rede: 13 de out. de 2025, 11:04:24 BRT S 17° 52' 58.402", W 51° 43' 38.202" Universidade Federal de Jataí - Campus Riachuelo</p>

Detalhe da viga baldrame concretada IN LOCO



Fiscal

Detalhe da informação pode pedido para DEMOLIÇÃO e REFAZIMENTO da viga baldrame

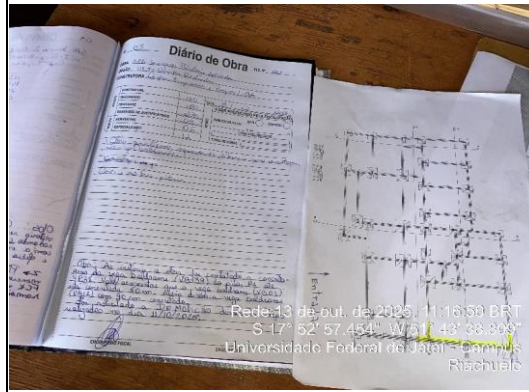

Responsável Técnico
