

	Dias Contratuais: 181	RDO: 00000018
	Dias Decorridos: 141	Data: 08/09/2025 (Segunda-Feira)
Obra: SPA - UFJ	Dias para Terminar: 40	Início: 21/04/2025
Endereço: Rodovia BR-364, Setor Francisco Antônio, 3800, Jataí - GO, 75804-068		Termino Previsto: 18/10/2025
Relatório Diário de Obra		

Comentários
O método mostrado nas fotos, com tijolo comum no embasamento, não é tecnicamente recomendado para fundações, pois não atende às boas práticas construtivas e nem às normas brasileiras vigentes. O uso desse recurso pode ser visto como uma prática não convencional e de risco para a durabilidade e segurança da obra.

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	31.3	M3	iniciado	CARPLAN Engenharia Projetos
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	84.6	Kg	em andamento	CARPLAN Engenharia Projetos
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	426.2	Kg	em andamento	CARPLAN Engenharia Projetos
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	508.8	Kg	em andamento	CARPLAN Engenharia Projetos
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	146.8	Kg	em andamento	CARPLAN Engenharia Projetos
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	38.4	Kg	em andamento	CARPLAN Engenharia Projetos
CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	31.3	M³	em andamento	CARPLAN Engenharia Projetos

Ocorrências
O método mostrado nas fotos, com tijolo comum no embasamento, não é tecnicamente recomendado para fundações, pois não atende às boas práticas construtivas e nem às normas brasileiras vigentes. O uso desse recurso pode ser visto como uma prática não convencional e de risco para a durabilidade e segurança da obra.

Observações
Obras sem alvará de construção.
Descrição do cronograma: item 01 - SERVIÇOS INICIAIS/ DESPESAS GERAIS ; (ATRASADO)
Descrição do cronograma: item 05 - INFRAESTRUTURA ; (ATRASADO)
Descrição do cronograma: item 06 - SUPERESTRUTURA ; (ATRASADO)

Galeria de Fotos	
Concretagem das sapatas  Rede:8 de set. de 2025, 11:04:26 BRT S 17° 52' 59.781", W 51° 43' 37.424" - Rua Marechal Rondon	Concretagem das sapatas  Rede:8 de set. de 2025, 11:04:55 BRT S 17° 52' 59.879", W 51° 43' 37.779" - Rua Napoleão Loreno

Concretagem das sapatas



Concretagem das sapatas



Concretagem das sapatas



Concretagem das sapatas



Concretagem das sapatas




Concretagem das sapatas



Concretagem das sapatas



Embasamento de tijolo furado

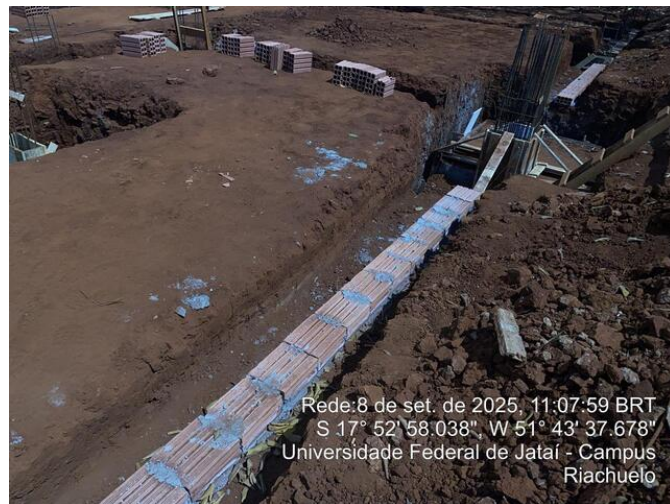

Concretagem das sapatas



Embasamento de tijolo furado



Embasamento de tijolo furado



Concretagem das sapatas



Fiscal

Responsável Técnico
