


	Dias Contratuais: 180	RDO: 00000026		
	Dias Decorridos: 179	Data: 16/10/2025 (Quinta-feira)		
Obra: SPA - UFJ	Dias para Terminar: 1	Início: 21/04/2025		
Endereço: Rodovia BR-364, Setor Francisco Antônio, 3800, Jataí - GO, 75804-068	Termino Previsto: 18/10/2025			
Relatório Diário de Obra				
Atividades / Tarefas	Quantidade	Unidade	Status	Empreiteiro
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA OBRA	1	UNID.	EXECUTADO	CARPLAN Engenharia Projetos
Ocorrências				
A fiscalização esteve no local (13/10/2025) e inspecionou a instalação elétrica realizada. A instalação está fora dos padrões mínimos e normas aceitáveis. É necessário que seja realizada a instalação conforme as normas ABNT NBR 5410, NBR 5418, Normas Regulamentadoras do MTE, NR 10, NR 12 e NR 18				
Galeria de Fotos				
LOCAL DA VISITA	Cabos trançados e enrolados no madeiramento			
 13/10/2025 10:54 17.882964133333335S 51.72745795W ondon, 825 - St. Oeste, Jataí - GO, 75804-240, Brasil	 13/10/2025 10:55 17.882848333333335S 51.72753883333334W ondon, 849 - St. Oeste, Jataí - GO, 75800-136, Brasil			
Cabos passados em galho de árvore	Tomada instalada sem a devida proteção, sem eletroduto e com os fios soltos.			
 13/10/2025 10:55 17.88283445S 51.72752878333334W ondon, 849 - St. Oeste, Jataí - GO, 75800-136, Brasil	 13/10/2025 10:56 17.882812233333335S 51.727538900000006W ondon, 849 - St. Oeste, Jataí - GO, 75800-136, Brasil			

Disjuntor exposto, sem nenhuma proteção. Pendurado com pregos.  13/10/2025 10:56 17.882671616666666S 51.72746323333334W ondon, 849 - St. Oeste, Jataí - GO, 75800-136, Brasil	Cabos passados sem a devida fixação. Fase e neutro em uma mesma roldana.  13/10/2025 10:57 17.88271935 51.727533583333326 ondon, 849 - St. Oeste, Jataí - GO, 75800-136, Brasil
Fios expostos, sem isolamento.  13/10/2025 10:57 17.88273715 51.727609116666666W ondon, 849 - St. Oeste, Jataí - GO, 75800-136, Brasil	Roldana única para fase e neutro  13/10/2025 10:57 17.88271808333334S 51.72758213333335W ondon, 849 - St. Oeste, Jataí - GO, 75800-136, Brasil
Fixação indevida dos cabos e do condutele  13/10/2025 10:57 17.88274495S 51.727562166666666W ondon, 849 - St. Oeste, Jataí - GO, 75800-136, Brasil	Tomada instalada sem a devida proteção, sem eletroduto e com os fios soltos. A guarda de materiais, como arame recozido para armação de estrutura não pode ser na roldana de passagem dos cabos elétricos.  13/10/2025 10:58 17.882729433333335S 51.727617266666666W ondon, 849 - St. Oeste, Jataí - GO, 75800-136, Brasil
Cabos amarrados à madeira, deve ser realizada a fixação conforme norma, cabos de fase e neutro não devem ser passados em uma mesma roldana.	Deve ser providenciada estrutura para alocação do sistema de vigilância e internet. A árvore não pode ser utilizada para este fim. Deve ser retirado todo o cabeamento amarrado / trançado na árvore.



Roldana única para fase e neutro.

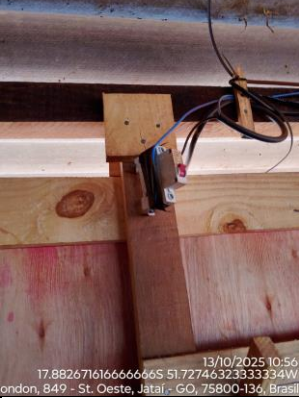

Régua fixada com pregos



Instalação elétrica fora de conformidade com as nomas de segurança.



Fiscal

Responsável Técnico
